

Форма по ОКУД
Инвестор
ГУП «Республиканские оросительные системы»
Заказчик (Генподрядчик)
ООО «ЭнергоТехноком»

по ОКПО

по ОКПО

37494256

Подрядчик (Субподрядчик)

Выполнение пуско-наладочных работ по объекту НСП-1 Рыбницкий район с. Гидирим, Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»

по ОКПО

Стройка:

по ОКПО

Объект

Монтаж, ремонт электрических установок

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер
дата

Контракт № 18-1
06.11.2024

Вид операции

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ документа	Дата составления
2024-0082	05.12.2024

Отчетный период

с	по
01.12.2024	31.12.2024

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Пусконаладочные работы							
1	ГЭСНп 01-02-017-02	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кв, с твердой изоляцией	шт				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		4,5	15,00		3074,63
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	1,8	27	45,55	1229,85
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	2,7	40,5	45,55	1844,78
2	ГЭСНп 01-02-016-02	Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 11 кв	шт				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		14	1,00		637,70
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	5,6	5,6	45,55	255,08
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	8,4	8,4	45,55	382,62
3	ГЭСНп 01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кв с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток 16 а	шт				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		1,8	5,00		409,95
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,9	4,5	45,55	204,98
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	0,9	4,5	45,55	204,98
4	ГЭСНп 01-03-020-01	Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кв с местным управлением и общим приводом: электромагнитным	шт				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		18	5,00		4099,50
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	5,4	27	45,55	1229,85
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	12,6	63	45,55	2869,65
5	ГЭСНп 01-06-011-02	Устройство комплектное для питания цепей электромагнитных приводов высоковольтных выключателей: с аппаратурой контроля, регулирования и сигнализации	шт				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		28,8	1,00		1311,84
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	8,64	8,64	45,55	393,55
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	20,16	20,16	45,55	918,29
6	ГЭСНп 01-06-010-02	Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВа: без стабилизации выходного напряжения	шт				

	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		10,8	2,00		983,88
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	3,24	6,48	45,55	295,16
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	7,56	15,12	45,55	688,72
7	ГЭСНп 01-10-002-01	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)	участок				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		23,49	1,00		1069,97
	3-100-01	Техник I категории	чел.-ч	9,4	9,4	45,55	428,17
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	14,09	14,09	45,55	641,80
8	ГЭСНп 01-13-001-03	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 10 шт.	присоединение				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		59,94	4,00		10921,07
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	41,96	167,84	45,55	7645,11
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	17,98	71,92	45,55	3275,96
9	ГЭСНп 01-04-051-01	Защита минимального напряжения	компл				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		10,08	4,00		1836,58
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	10,08	40,32	45,55	1836,58
10	ГЭСНп 01-04-062-03	Защита от замыканий на "землю": с реле зпп-1	компл				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		15,12	1,00		688,72
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	4,54	4,54	45,55	206,80
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	10,58	10,58	45,55	481,92
11	ГЭСНп 01-04-012-01	Двухфазная токовая отсечка: (комплект кз-9)	компл				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		11,52	4,00		2098,94
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	3,46	13,84	45,55	630,41
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	8,06	32,24	45,55	1468,53
12	ГЭСНп 01-04-012-04	Мтз с независимой выдержкой времени: (комплект кз-12)	компл				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		10,8	5,00		2459,70
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	3,24	16,2	45,55	737,91
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	7,56	37,8	45,55	1721,79
	Сумма по разделу:						
	В т.ч. зарплата	Среднечасовая заработная плата рабочих 45,55 руб./час Приказ МЭР ПМР №1144 от 03.11.2023 г.	руб./час	45,55			29592,5
		Производство работ в электроустановках, под напряжением п. 4	К	1,3			38470,2
	ЕСН	Отчисления соц. Страх 25%	%	25			9617,6
	Резерв отпусков	Резерв отпусков 11,36% (приказ МЭР ПМР №35 от 18.01.2023)	%	11,36			4370,2
	ИТОГО 1						52458,0
	Накладные расходы	Накладные расходы 60% Приказ МЭР ПМР №1144 от 03.11.2023 г.	%	60			28852,7
	ИТОГО 2						81310,6
	Сметная прибыль	Сметная прибыль 15 % Приказ МЭР ПМР №1144 от 03.11.2023 г.	%	15			12196,6
	ИТОГО 3						93507,2
	ВСЕГО:						93507,00

Сдал:


ООО "ЭнергоТехникКом"
Директор Качук А.П.



2024 г.

Принял:

ГУП «Республиканские оросительные системы»
Генеральный директор Ботя И.А.

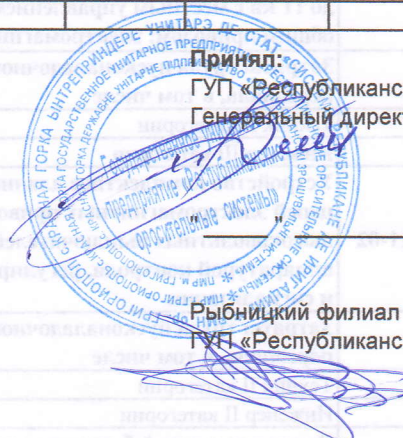

2024 г.

Рыбницкий филиал

ГУП «Республиканские оросительные системы»

2024 г.
